



# Mark

Läge för det goda livet

Skredriskåtgärder Hedbo  
Information om etapp 1

# Medverkande

## Marks kommun

- Viktor Larsson, Projektledare

## Veidekke Entreprenad AB

- Anders Ydreskog, Produktionschef
- Fredrik Amundsjö, Arbetsledare

# Informationsmöte - Agenda

- Övergripande om projektet
- Entreprenad
- Säkerhet
- Vidare arbete



# Samverkansentreprenad

Beställare



# Mark



# AFRY

ÅF PÖRY

Projektering

Entreprenad



# VEIDEKKE

## Vad har hänt hittills?

2009-2014

Stabilitetskartering MSB  
Utredningar/förstudie

2015-2017

Definiera åtgärder  
Avschaktning + tryckbank

2018-2019

Tillståndsansökan vattenverksamhet

2019-2020

Kompletteringar vattenverksamhet  
Undersökningar och detaljprojektering

2020-2021

Domslut, lagakraftvunnet

# Tidplan

## Förberedelser

Undersökning



Förstudie/  
Vattendom

Här är vi  
nu



## Ettapp 1

Detaljprojektering  
Höst 2020



Entreprenad  
Ettapp 1  
Vinter/vår 2021



Avslut  
Höst 2021

## Ettapp 2

Detaljprojektering  
Vinter/vår 2021



Entreprenad  
Ettapp 2  
Sommar/höst  
2021



Avslut  
Höst 2021

## Tidplan forts.

- Begränsas av restriktioner för häckande fåglar och fisk
- Förberedelser & avschaktning släntkrön – januari – mars
  - Byggvägar
- Tryckbank slänkfot – mitten på augusti – november

Resultatet?

# Veidekkes arbete – etapp 1

- Etablering
- Besiktning – etapp 1
- Mätare
- Avverkning
- Arbetsområde
- Byggvägar






# Veidekkes arbete – etapp 1

- Etablering
- Besiktning – etapp 1
- Mätare
- Avverkning
- Arbetsområde
- Byggvägar
- Schakt i naturmark
  - Mycket massor ska bort
- Efterbesiktning
  - Etapp 1
- Återställning
  - Etapp 2
- Slutbesiktning entreprenad



# Säkerhet – etapp 1

- Mätare
  - Inklinometer – på djupet
  - Peglar – på ytan
- Nödlägesplan – Veidekke
- Handlingsplan skred – Marks kommun
- Mätare kontrolleras och mäts in 2 ggr per dag
- Larm till kommunen från inklinometer
- Ej vistas inom avspärningar, förbjudet
- Ej beträda området

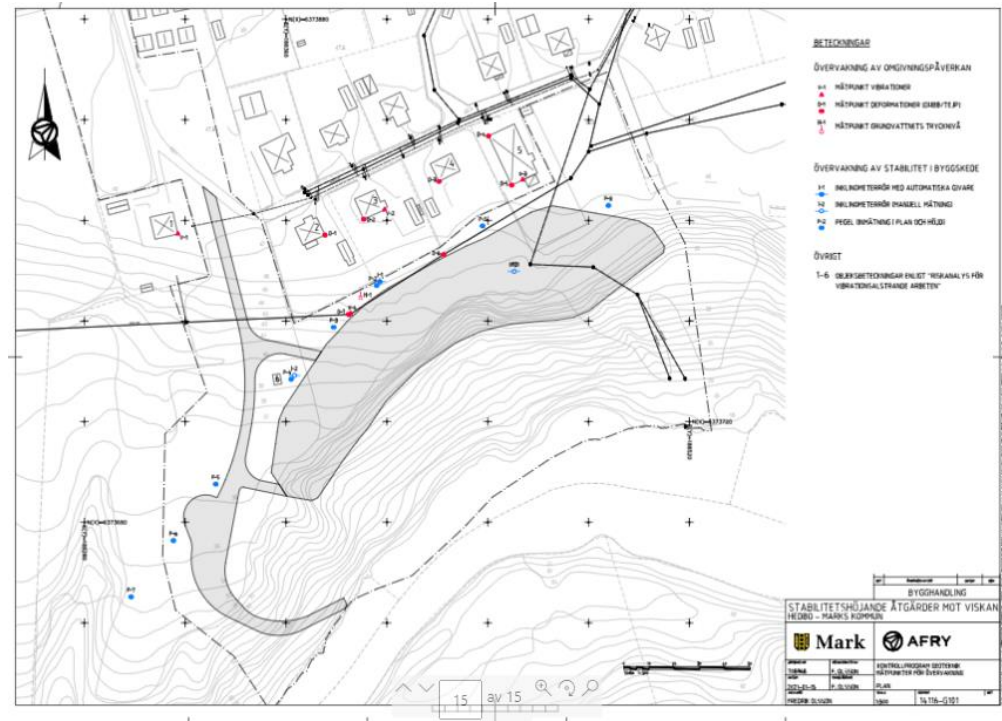

# Säkerhet – etapp 1

## Vad kan jag göra?


- Hålla koll på omgivningen
  - Träd lutar inåt slänt
  - Sprickor i mark
  - Husgrund
  - Ljud



- Publikation från MSB, "Händelsescnario skred"
  - Länk: <https://www.msb.se/sv/publikationer/handelsescenario-skred/>
- Vid synliga tecken på skred, ring 112!

# Vidare

- Paus i arbete 1:e april
- Tryckbank detaljprojekteras parallellt
- Tillåtelse att starta 11:e augusti
- Stopp för arbete i vatten 30:e september
- Arbete ovanför vatten efter 30:e september

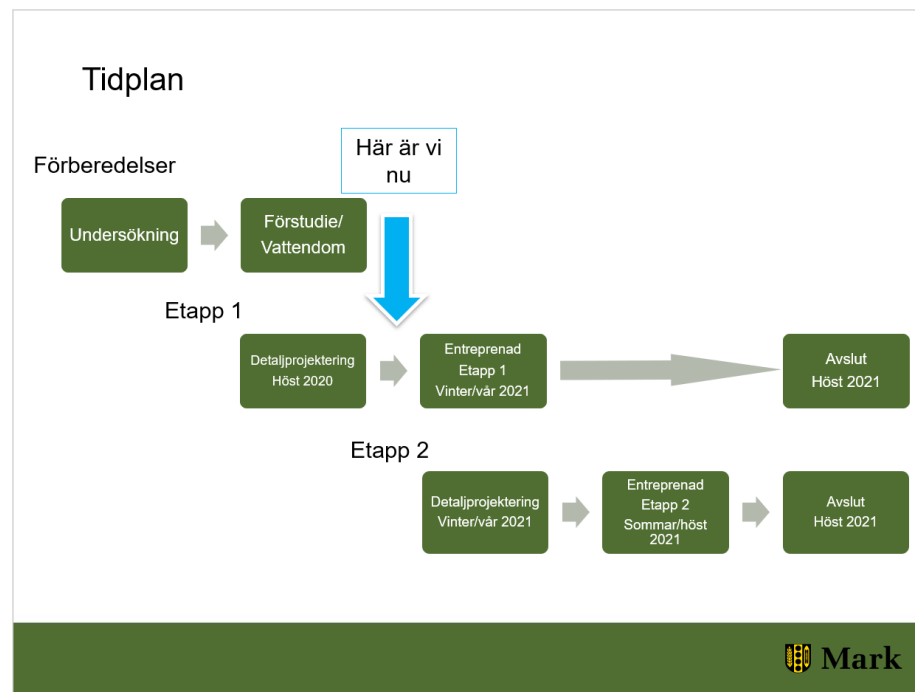

Kontakta oss gärna:

Marks kommun

Viktor Larsson

Telefon: 0320-21 71 70

E-post: [Viktor.Larsson@mark.se](mailto:Viktor.Larsson@mark.se)



**Mark**

Veidekke Entreprenad AB

Anders Ydreskog

Telefon: 070-574 23 63

E-post: [Anders.Ydreskog@veidekke.se](mailto:Anders.Ydreskog@veidekke.se)

